
Aperi IDVT - Phase 2


Week Ending	11/10/06	11/17/06	11/22/06	12/01/06	12/08/06	12/15/06	12/22/06
Planned Exposed	15	45	60	100	140	187	187
Planned Successful	14	43	57	95	133	178	178
Actual Exposed	3	26	64	109	134	0	0
Actual Successful	0	22	60	95	111	0	0
Blocked	23	0	0	0	0	0	0


Plan % Exposed	8%	24%	32%	53%	75%	100%	100%
Plan % Success	8%	23%	30%	51%	71%	95%	95%
Actual % Exposed	2%	14%	34%	58%	72%	0%	0%
Actual % Success	0%	12%	32%	51%	59%	0%	0%
% Blocked	12%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Aperi IDVT (Phase 2) (Preliminary scenario count subject to change)

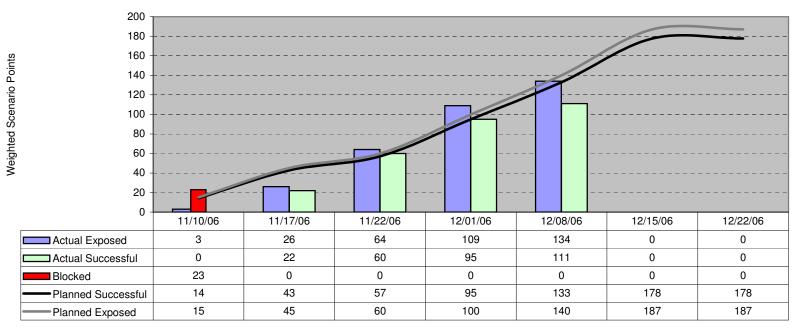


Aperi IDVT, Phase 2 Defect Discovery Week Ending	11/10/06	11/17/06	11/22/06	12/01/06	12/08/06	12/15/06	12/22/06
IDVT Estimate							
New (open)	2	4	4	7	28	0	0
Assigned (working)	0	0	0	1	4	0	0
Resolved (verified)	0	0	5	0	10	0	0
Verified (closed)	0	0	0	0	3	0	0
Reopened	0	0	0	0	0	0	0
Invalid	1	1	1	0	0	0	0
Canceled	0	0	1	0	0	0	0
Total (N.I. can/inv)	2	4	9	8	45	0	0

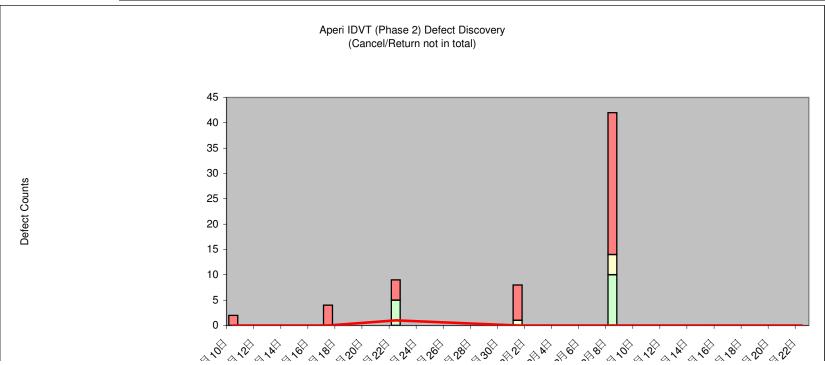



Defect Inventory: Sev 1,2	11/10/06	11/17/06	11/22/06	12/01/06	12/08/06	12/15/06	12/22/06
1,2	11/10/00	11/17/00	11/22/00	12/01/00	12/00/00	12/13/00	12/22/00
New (open)	1	2	4	0	3	0	0
Assigned (working)	0	0	0	0	1	0	0
Total	1	2	4	0	4	0	0

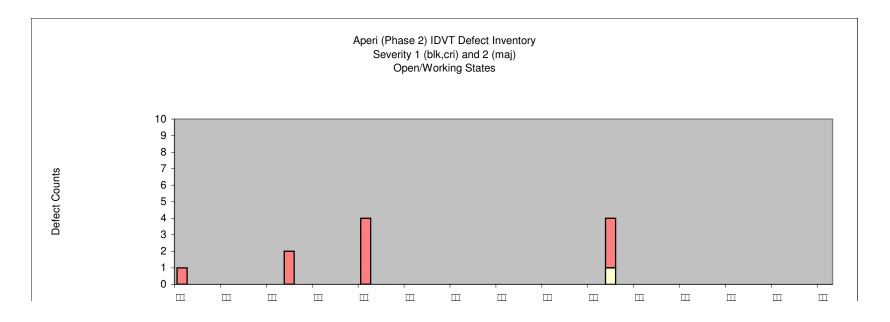

() 								_		-		-		$\overline{}$
	2006年11月10日	2006年11月13日	2006年11月16日	2006年11月19日	2006年11月22日	2006年11月25日	2006年11月28日	2006年12月1日	2006年12月4日	2006年12月7日	2006年12月10日	2006年12月13日	2006年12月16日	2006年12月19日	2006年12月22日
		11/10/06		11/17/06		11/22/06		12/01/06		12/08/06		12/15/06	;	12/22/06	6
■ New (open)		1		2		4		0		3		0		0	
Assigned (working	1)	0		0		0		0		1		0		0	

Defect Discovery

<u>Defects</u>	<u>Severity</u>	<u>Description</u>
0	1	Blocker, Critical
4	2	Major
25	3	Normal
3	4	Minor. Trivial. Enhancement

